

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas con ordenamiento vial	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	12216196	12216196		Ejecución fina	221579.75	172542.40	222319.49	256103.20	872544.84	7.14%	2028034.32	16.6%	7.14%	16.6%
356307-MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA ENTRE 7MA. CALLE Y 13VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	955	955	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3249128	3249128	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
356309-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 5TA. AVENIDA Y 6TA. AVENIDA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	110	110	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	629160	629160	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
356570-MEJORAMIENTO CALLE 8VA AVENIDA ENTRE 13VA CALLE Y 16VA CALLE, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	535	535	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1734600	1734600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
356314-MEJORAMIENTO CALLE 11VA. CALLE ENTRE 7MA. AVENIDA Y GASOLINERA MERCEDES, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	410	410	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1729992	1729992	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
356313-MEJORAMIENTO CALLE 7MA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 11VA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	295	295	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1358600	1358600	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
356308-MEJORAMIENTO CALLE 6TA. AVENIDA ENTRE 8VA. CALLE Y 10MA. CALLE, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	420	420	1	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	4	.95%	0%	.95%
		Meta financiera	1328520	1328520	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	577744.74	43.49%	0%	43.49%
346038-CONSERVACION PERIODICO CARRETERA PAVIMENTADA DE LA CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2186196	2186196	0	Ejecución financiera	221579.75	172542.40	222319.49	256103.20	872544.84	39.91%	1450289.58	66.34%	39.91%	66.34%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente															
Áreas de uso urbano regulado	Metro cuadrado	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5580260	5580260		Ejecución fina	681181.54	727332.32	655349.23	0	2063863.09	36.99%	5580260	100%	36.99%	100%
345987-CONSERVACION SERVICIOS DE LA INFRAESTRUCTURA PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	2	2	2	2	8	66.67%	12	100%	66.67%	100%
		Meta financiera	5580260	5580260	0	Ejecución financiera	681181.54	727332.32	655349.23	0	2063863.09	36.99%	5580260	100%	36.99%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras y caminos terciarios	Kilometro	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	12713170.59	12941448.09		Ejecución fina	0	421779	1279214.2	1876255.4	3577248.76	27.64%	8247802.29	63.73%	28.14%	64.88%
336944-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR SALOJ, CASERIO CENTRAL, ALDEA CHAQUIJYA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1500	1500	3	Ejecución física	0	0	750	380	1130	75.33%	1130	75.33%	75.33%	75.33%
		Meta financiera	760000	760000	3	Ejecución financiera	0	0	284966.28	287242.20	572208.48	75.29%	572208.48	75.29%	75.29%	75.29%
332689-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHURUNELES II, ALDEA PUJUIJIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1160	1160	2	Ejecución física	0	0	580	450	1030	88.79%	1030	88.79%	88.79%	88.79%
		Meta financiera	525000	525000	2	Ejecución financiera	0	0	196913.68	260265.60	457179.28	87.08%	457179.28	87.08%	87.08%	87.08%
332424-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CHUARIXCHE, ALDEA EL TABLON, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1720	1720	2	Ejecución física	0	0	860	860	1720	100%	1720	100%	100%	100%
		Meta financiera	775000	775000	2	Ejecución financiera	0	0	290541.50	482648.80	773190.30	99.77%	773190.30	99.77%	99.77%	99.77%
332423-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO EL ENCANTO, ALDEA PUJUIJIL II, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1280	1280	2	Ejecución física	0	0	640	640	1280	100%	1280	100%	100%	100%
		Meta financiera	577575	577575	2	Ejecución financiera	0	0	216499.74	359899.56	576399.30	99.8%	576399.30	99.8%	99.8%	99.8%
332688-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO KAYALA, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1720	1720	2	Ejecución física	0	0	860	430	1290	75%	1290	75%	75%	75%
		Meta financiera	775000	775000	2	Ejecución financiera	0	0	290293.08	290486.36	580779.44	74.94%	580779.44	74.94%	74.94%	74.94%
351657-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBALBAY CEN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	2	Ejecución física	0	0	0	75	75	37.5%	75	37.5%	37.5%	37.5%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
355116-MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) COLONIA JUSTO RUFINO BARRIOS, BARRIO SAN BARTOLO, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	136100	136100	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	136010	99.93%	0%	99.93%
346041-CONSERVACION CARRETERAS DE TERRACERIA EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	4	33.33%	0%	33.33%
		Meta financiera	3669674	3669674	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	1622196.24	44.21%	0%	44.21%
Eje Katun:																
Proridad Nacional de Desarrollo:																
Meta Estratégica de Desarrollo:																
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física			0	Ejecución físic	1	1	1	1	4	0%	8	0%	0%	0%
		Meta financier	30478873.25	30478873.25		Ejecución fina	2895229.5	2346099.8	3165749.3	2791403.9	11198482.72	36.74%	19490008.70	63.95%	36.74%	63.95%
Dirección y Coordinación	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	25910271.05	25910271.05	0	Ejecución financiera	2895229.55	2346099.88	3165749.34	2791403.95	11198482.72	43.22%	19490008.70	75.22%	43.22%	75.22%
PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	Documento	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4568602.20	4568602.20	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
351657-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO XIBALBAY CEN	Metro cuadrado	Meta financiera	525000	525000	2	Ejecución financiera	0	0	0	195712.96	195712.96	37.28%	195712.96	37.28%	37.28%	37.28%
339683-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR TUN, CASERIO LOS CASTRO, ALDEA XAJAXAC, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1250	1250	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1250	100%	0%	100%
		Meta financiera	530680	659400	2	Ejecución financiera	0	421779	0	0	421779	63.96%	659400	100%	79.48%	124.26%
295553-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO VISTA HERMOSA, ALDEA LOS ENCIENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	300000	349574.50	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
295552-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CASERIO CENTRAL, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	410850	460833	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335025-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR I, CASERIO MAYA KAQCHIQUEL, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	395226.12	395226.12	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	395226.12	100%	0%	100%
330891-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE LA CARRETERA CA-1 HACIA CEMENTERIO COMUNITARIO, ALDEA CHAQUIIYA CENTRAL SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	507198.83	507198.83	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	507198.83	100%	0%	100%
335751-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES SECTOR ESCUELA Y SECTOR LOPEZ, CASERIO ORATORIO, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	337420.89	337420.89	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	337420.89	100%	0%	100%
335029-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR NEBOYA, CASERIO LOS YAXON, ALDEA EL TABLON SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	0	0	1	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	490135.75	490135.75	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	490135.75	100%	0%	100%
355080-MEJORAMIENTO CALLE (DOTACION DE MATERIALES) 10A. AVENIDA ENTRE 7A. Y 9A. CALLE, BARRIO EL CALVARIO SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	1	Ejecución física					0	0%	1200	100%	0%	100%
		Meta financiera	172800	172800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	172734.70	99.96%	0%	99.96%
345793-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL EN VARIAS COMUNIDADES DEL AREA RURAL CON DOTACION DE MATERIALES, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	9250	9250	1	Ejecución física					0	0%	9250	100%	0%	100%
		Meta financiera	1825510	1825510	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	772010	42.29%	0%	42.29%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física		9493491	1	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	3909497	4739047		Ejecución fina	82440	54280.70	27421.21	144030.13	308172.04	6.5%	1305864.29	27.56%	7.88%	33.4%
345868-APOYO INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LA EDUCACION PRIMARIA, BASICA, DIVERSIFICADA Y UNIVERSITARIA DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	675000	675000	0	Ejecución financiera	82440	54280.70	27421.21	144030.13	308172.04	45.66%	518758.04	76.85%	45.66%	76.85%
336977-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XALAMA, ALDEA PIXABAJ SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	450	450	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	760000	760000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
336951-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO MONTE MERCEDES, CANTON SACSIGUAN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	500	500	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	860000	860000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
336976-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO XOLBE, ALDEA EL TABLÓN SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	450	475	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	760000	760000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
336978-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA E O R M CASERIO EL MIRADOR, ALDEA PUJUIL II SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	470	470	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	784497	784497	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
314801-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , E.O.R.M. CASERIO LOS YAXON, ALDEA CHAQUIIYA, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	120	120	2	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	70000	899550	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	787106.25	87.5%	0%	1124.44%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física				0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%
		Meta financier	7291386.53	8821746.83			Ejecución fina	275647.34	202058.64	241564.73	598511.97	1317782.68	14.94%	4011417.30	45.47%	55.02%
314777-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JUAN ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	1000	1000	2	Ejecución física	0	0	0	320	320	32%	320	32%	32%	32%
		Meta financiera	1525000	1525000	2	Ejecución financiera	0	0	0	429289.23	429289.23	28.15%	429289.23	28.15%	28.15%	28.15%
336982-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO EL CARMEN, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	320	320	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1935930	1935930	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335023-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR MENDOZA, CASERIO VASCONSELO, ALDEA XAJAXAC SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	5	5	2	Ejecución física					0	0%	5	100%	0%	100%
		Meta financiera	65625	647485	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	495730.70	76.56%	0%	755.4%
339686-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE 60 VUELTAS, CASERIO SAN JUAN, ALDEA PIXABAJ, SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	2000	2000	2	Ejecución física					0	0%	2000	100%	0%	100%
		Meta financiera	712000	892601.90	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	428663.10	48.02%	0%	60.21%
340080-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO EL PARAISO, ALDEA LOS ENCUENTROS, SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	25	25	2	Ejecución física					0	0%	25	100%	0%	100%
		Meta financiera	288441.60	360500	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	360500	100%	0%	124.98%
335015-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CASERIO CHURUNEL CENTRAL, ALDEA PUJUIL III SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	0	0	2	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	369124.93	369124.93	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	369124.93	100%	0%	100%
335016-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR CASTRO, CASERIO CENTRAL, ALDEA LOS ENCUENTROS SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	250	250	2	Ejecución física					0	0%	250	100%	0%	100%
		Meta financiera	158960	854800	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	430178.10	50.33%	0%	270.62%
345986-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2236305	2236305	0	Ejecución financiera	275647.34	202058.64	241564.73	169222.74	888493.45	39.73%	1497931.24	66.98%	39.73%	66.98%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	920	920	0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	10476397.05	17088263.70		Ejecución fina	110531.22	0	0	0	110531.22	0.65%	7101138.70	41.56%	1.06%	67.78%
330863-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 8VA. AVENIDA ENTRE 4TA. Y 11VA. CALLE, ZONA 2, CABECERA MUNICIPAL SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	562	562	3	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	162	28.83%	0%	28.83%
		Meta financiera	3207125	6396515.44	3	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3189390.44	49.86%	0%	99.45%
332380-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 5TA. AVENIDA ENTRE 6TA. Y 13AV. CALLE SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	542	542	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	4025000	4025000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
332367-MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO 10MA. CALLE ENTRE 7MA. Y 9NA. AVENIDA Y 9NA AVENIDA ENTRE 10MA. Y 11VA. CALLE SOLOLA, SOLOLA	Metro	Meta física	542	542	2	Ejecución física	0	0	0		0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	2755000	2755000	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
335014-AMPLIACION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES ALDEA SAN JORGE LA LAGUNA SOLOLA, SOLOLA	Metro cuadrado	Meta física	20	20	2	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	20	100%	0%	100%
		Meta financiera	43302.05	675000	2	Ejecución financiera	110531.22	0	0	0	110531.22	16.37%	675000	100%	255.26%	1558.82%
208051-CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA.	Metro	Meta física	120	120	2	Ejecución física					0	0%	120	100%	0%	100%
		Meta financiera	445970	3236748.26	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	3236748.26	100%	0%	725.78%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	3525160	3525160		Ejecución financiera	255065.69	324727.80	166251.57	525844.50	1271889.56	36.08%	2565422.91	72.77%	36.08%	72.77%
345959-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION DE DESECHOS SOLIDOS DE LA CABECERA MUNICIPAL, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2458300	2458300	0	Ejecución financiera	200550.57	196991.50	71722.11	416615.10	885879.28	36.04%	1771383.78	72.06%	36.04%	72.06%
345970-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS EN LA PLANTA DE COXOM ARGUETA, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1066860	1066860	0	Ejecución financiera	54515.12	127736.30	94529.46	109229.40	386010.28	36.18%	794039.13	74.43%	36.18%	74.43%
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial															
Meta Estratégica de Desarrollo:	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de la ciudadanía															
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Persona	Meta física			0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	5308676	5308676		Ejecución financiera	346016.37	545914.46	488030.05	418511.09	1798471.97	33.88%	3936842.63	74.16%	33.88%	74.16%
345887-APOYO FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES DE LA MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	5308676	5308676	0	Ejecución financiera	346016.37	545914.46	488030.05	418511.09	1798471.97	33.88%	3936842.63	74.16%	33.88%	74.16%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

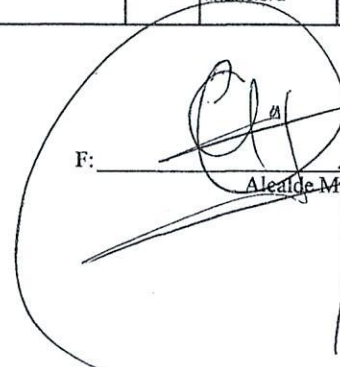
Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Personas beneficiadas con difusión cultural, artística y literaria.	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2189950	2189950		Ejecución fina	90140	279400	277368	229701.20	876609.20	40.03%	2120569.20	96.83%	40.03%	96.83%
346043-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO A LOS PROGRAMAS DE LA MUJER, JUVENTUD Y NINEZ EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	1404950	1404950	0	Ejecución financiera	70465	249400	217100	198401.20	735366.20	52.34%	1357346.20	96.61%	52.34%	96.61%
346042-CAPACITACION TALLER (ES) A LA CIUDADANIA EN EL MUNICIPIO Y DEPARTAMENTO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	785000	785000	0	Ejecución financiera	19675	30000	60268	31300	141243	17.99%	763223	97.23%	17.99%	97.23%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Se ha reducido la precariedad laboral mediante la generación de empleos decentes y de calidad. a) Disminución gradual de la tasa de subempleo a partir del último dato disponible: 16.9% b) Disminución gradual de la informalidad a															
Personas Orientadas e Intermediadas en el Mercado Laboral	Persona	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	2715560	2715560		Ejecución fina	132011.40	285037	276402.29	180611.40	874062.09	32.19%	1716665.99	63.22%	32.19%	63.22%
346039-APOYO TALLER(ES) PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE FOMENTO ECONOMICO EN EL MUNICIPIO DE SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	2715560	2715560	0	Ejecución financiera	132011.40	285037	276402.29	180611.40	874062.09	32.19%	1716665.99	63.22%	32.19%	63.22%
Eje Katun:	Riqueza para Todos y Todas															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Empleo e inversión															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales															
Promoción de destinos turísticos de Guatemala	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	600000	600000		Ejecución fina	45311	50576	18000	27975	141862	23.64%	587028	97.84%	23.64%	97.84%
345940-CONSERVACION PARQUE RECREATIVO COMPLEJO TURISTICO MUNICIPAL EL JAIBAL ATITLAN, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	8	66.67%	33.33%	66.67%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	45311	50576	18000	27975	141862	23.64%	587028	97.84%	23.64%	97.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras Segundo Cuatrimestre 2025

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SOLOLA**

Fecha y Hora: 4/09/2025 12:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Segundo Cuatrimestre					% Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 2do. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total					
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países															
Servicios de emergencia proporcionados a la población	Evento	Meta física			0	Ejecución físic					0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financier	100000	100000		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
346044-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA LA PREVENCION ANTE LAS EMERGENCIAS Y CALAMIDADES, SOLOLA, SOLOLA	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	0%

F:  
Alcalde Municipal
